2021 11 17 CR Haguenau Planning X
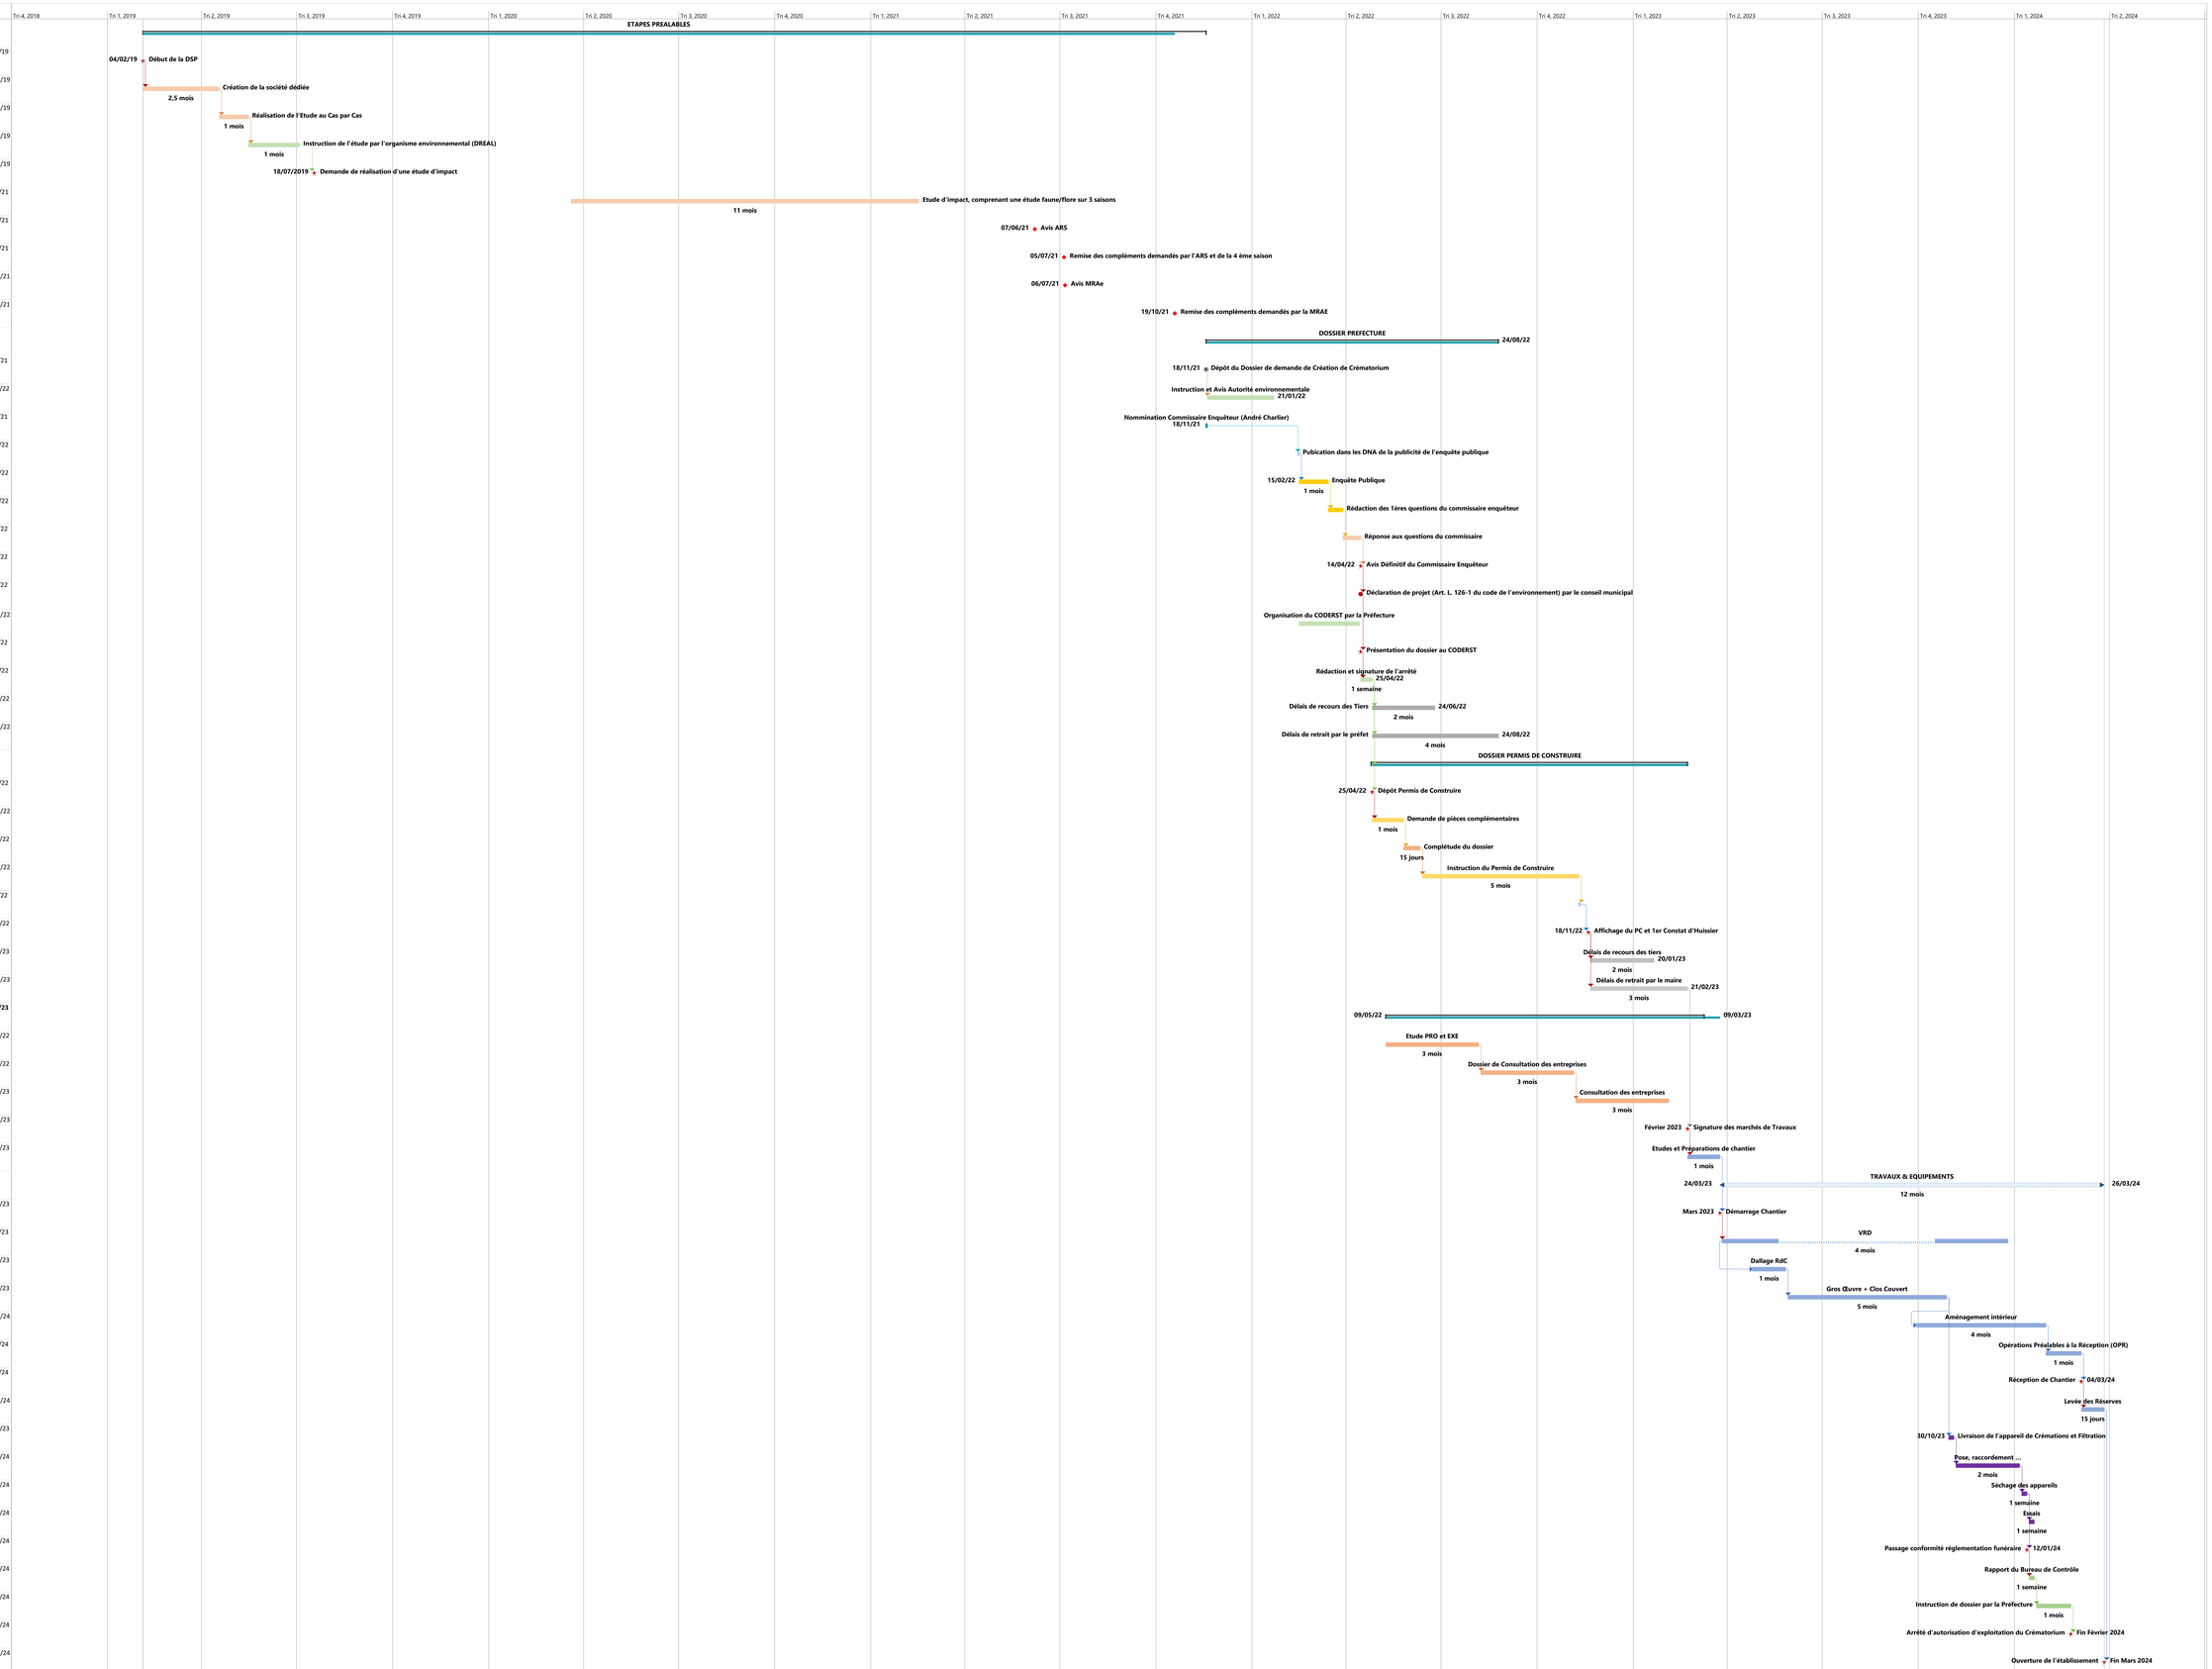
N°	Nom de la tâche	Texte1	Durée	Début	Fin
1	**ETAPES PREALABLES**	**27,5 mois**	**728 jours**	**Lun 04/02/19**	**Mer 17/11/21**
2	***Début de la DSP***	**Février 2019**	0 jour	Lun 04/02/19	Lun 04/02/19
3	***Création de la société dédiée***	***2,5 mois***	53 jours	Lun 04/02/19	Mer 17/04/19
4	***Réalisation de l'Etude au Cas par Cas***	**1 mois**	20 jours	Jeu 18/04/19	Mer 15/05/19
5	***Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)***	**1 mois**	35 jours	Jeu 16/05/19	Mer 03/07/19
6	***Demande de réalisation d'une étude d'impact***	**18/07/20**	0 jour	Mer 17/07/19	Mer 17/07/19
7	***Etude d'impact, comprenant une étude faune/flore sur 3 saisons***	***11 mois***	237 jours	Ven 20/03/20	Lun 15/02/21
8	***Avis ARS***		0 jour	Lun 07/06/21	Lun 07/06/21
9	***Remise des compléments demandés par l'ARS et de la 4 ème saison***		0 jour	Lun 05/07/21	Lun 05/07/21
10	***Avis MRAe***		0 jour	Mar 06/07/21	Mar 06/07/21
11	***Remise des compléments demandés par la MRAE***		0 jour	Mar 19/10/21	Mar 19/10/21
12	**DOSSIER PREFECTURE**		**200 jours**	**Jeu 18/11/21**	**Mer 24/08/22**
13	***Dépôt du Dossier de demande de Création de Crématorium***		1 jour	Jeu 18/11/21	Jeu 18/11/21
14	***Instruction et Avis Autorité environnementale***		46 jours	Ven 19/11/21	Ven 21/01/22
15	Nommination Commissaire Enquêteur (André Charlier)		1 jour	Jeu 18/11/21	Jeu 18/11/21
16	***Pubication dans les DNA de la publicité de l'enquête publique***		1 jour	Lun 14/02/22	Lun 14/02/22
17	***Enquête Publique***	***1 mois***	20 jours	Mar 15/02/22	Lun 14/03/22
18	***Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur***		10 jours	Mar 15/03/22	Lun 28/03/22
19	***Réponse aux questions du commissaire***		13 jours	Mar 29/03/22	Jeu 14/04/22
20	***Avis Définitif du Commissaire Enquêteur***		0 jour	Jeu 14/04/22	Jeu 14/04/22
21	***Déclaration de projet (Art. L. 126-1 du code de l'environnement) par le conseil municipal***		0 jour	Jeu 14/04/22	Jeu 14/04/22
22	***Organisation du CODERST par la Préfecture***		42 jours	Mar 15/02/22	Mer 13/04/22
23	***Présentation du dossier au CODERST***		0 jour	Jeu 14/04/22	Jeu 14/04/22
24	***Rédaction et signature de l'arrêté***	***1 semaine***	7 jours	Ven 15/04/22	Lun 25/04/22
25	***Délais de recours des Tiers***	***2 mois***	44 jours	Mar 26/04/22	Ven 24/06/22
26	***Délais de retrait par le préfet***	***4 mois***	87 jours	Mar 26/04/22	Mer 24/08/22
27	**DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE**		**217 jours**	**Lun 25/04/22**	**Mar 21/02/23**
28	***Dépôt Permis de Construire***		0 jour	Lun 25/04/22	Lun 25/04/22
29	***Demande de pièces complémentaires***	***1 mois***	22 jours	Mar 26/04/22	Mer 25/05/22
30	***Complétude du dossier***	***15 jours***	12 jours	Jeu 26/05/22	Ven 10/06/22
31	***Instruction du Permis de Construire***	***5 mois***	108 jours	Lun 13/06/22	Mer 09/11/22
32	***Accord PC***		1 jour	Jeu 10/11/22	Jeu 10/11/22
33	***Affichage du PC et 1er Constat d'Huissier***		0 jour	Ven 18/11/22	Ven 18/11/22
34	***Délais de recours des tiers***	***2 mois***	45 jours	Lun 21/11/22	Ven 20/01/23
35	***Délais de retrait par le maire***	***3 mois***	67 jours	Lun 21/11/22	Mar 21/02/23
36	**ETUDES ET PREPARATION**	**7 mois**	**219 jours**	**Lun 09/05/22**	**Jeu 09/03/23**
37	***Etude PRO et EXE***	**3 mois**	65 jours	Lun 09/05/22	Ven 05/08/22
38	***Dossier de Consultation des entreprises***	**3 mois**	65 jours	Lun 08/08/22	Ven 04/11/22
39	***Consultation des entreprises***	**3 mois**	65 jours	Lun 07/11/22	Ven 03/02/23
40	***Signature des marchés de Travaux***	**Février 2023**	0 jour	Mar 21/02/23	Mar 21/02/23
41	***Etudes et Préparations de chantier***	**1 mois**	23 jours	Mer 22/02/23	Ven 24/03/23
42	**TRAVAUX & EQUIPEMENTS**	**12 mois**	**262 jours**	**Ven 24/03/23**	**Mar 26/03/24**
43	***Démarrage Chantier***	**Mars 2023**	0 jour	Ven 24/03/23	Ven 24/03/23
44	***VRD***	**4 mois**	90 jours	Lun 27/03/23	Lun 25/12/23
45	***Dallage RdC***	**1 mois**	24 jours	Mar 25/04/23	Ven 26/05/23
46	***Gros Œuvre + Clos Couvert***	**5 mois**	110 jours	Lun 29/05/23	Ven 27/10/23
47	***Aménagement intérieur***	**4 mois**	88 jours	Ven 29/09/23	Mar 30/01/24
48	***Opérations Préalables à la Réception (OPR)***	**1 mois**	24 jours	Mer 31/01/24	Lun 04/03/24
49	***Réception de Chantier***		0 jour	Lun 04/03/24	Lun 04/03/24
50	***Levée des Réserves***	**15 jours**	16 jours	Mar 05/03/24	Mar 26/03/24
51	***Livraison de l'appareil de Crémations et Filtration***		5 jours	Lun 30/10/23	Ven 03/11/23
52	***Pose, raccordement ...***	**2 mois**	45 jours	Lun 06/11/23	Ven 05/01/24
53	***Séchage des appareils***	**1 semaine**	5 jours	Lun 08/01/24	Ven 12/01/24
54	***Essais***	**1 semaine**	5 jours	Lun 15/01/24	Ven 19/01/24
55	***Passage conformité réglementation funéraire***		0 jour	Ven 12/01/24	Ven 12/01/24
56	***Rapport du Bureau de Contrôle***	**1 semaine**	5 jours	Lun 15/01/24	Ven 19/01/24
57	***Instruction de dossier par la Préfecture***	**1 mois**	25 jours	Lun 22/01/24	Ven 23/02/24
58	***Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium***	**Fin Février 2024**	0 jour	Ven 23/02/24	Ven 23/02/24
59	***Ouverture de l'établissement***	**Fin Mars 2024**	0 jour	Mar 26/03/24	Mar 26/03/24
60
